

แผนและผลการบริหารและจัดการน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2556 สำนักชลประทานที่ 16

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

1. แผนและผลปฏิบัติการ แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่

ก. แผนงานก่อนน้ำมา หรือก่อนเกิดภัย

ข. แผนงานระหว่างน้ำมา หรือขณะเกิดภัย

ค. แผนงานหลังอุทกภัย หรือหลังเกิดภัย

โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ ดังรายละเอียดตามตาราง

กิจกรรม	2556								2557				ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		
ก) แผนงานก่อนน้ำมา หรือก่อนเกิดภัย														จนท.ศูนย์ประมวลฯ
◆แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย														
- การคาดการณ์และการติดตามสถานะทางอุตุ -อุทกวิทยา														
- การบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยใช้ ROS และ Operation Rule Curve														ผบร.ชป.16,ผอ.คป., ผอ.คบ.
- การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและการบริหารน้ำหลาก														จนท.ศูนย์ประมวลฯ
- การจัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ														ผส.ชป.16,ผอ.คป., ผอ.คบ.
- การบริหารข้อมูล เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทาง Internet														ผบร.ชป.16,ผอ.คป., ผอ.คบ.
◆แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วย														ผอ.คป.,ผอ.คบ.
- การขุดลอกและกำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน / อ่างเก็บน้ำ														
- การซ่อมแซมบำรุงรักษา														ผอ.คป.,ผอ.คบ.
- การตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานต่าง ๆ														ผอ.คป.,ผอ.คบ.
- การเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ														ผศป.ที่7, ผคก.ชป.16

*หมายเหตุ

 แผนงาน  ผลงาน

กิจกรรม	2556								2557				ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		
ข) แผนงานระหว่างน้ำมา หรือ ขณะเกิดภัย - ปรับแผนการระบายน้ำจากอ่างฯ เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมด้านท้าย								54%						ผอ.คป.,ผอ.คบ.
- การส่งน้ำเข้าระบบชลประทานในพื้นที่การเกษตรโดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานเพื่อลดยอดน้ำถ้าปฏิบัติได้								56%						ผอ.คป.,ผอ.คบ.
- เสริมความแข็งแรงของอาคารชลประทาน งานเสริมคันกันน้ำงานปิดท่อและอื่น ๆ								56%						ผอ.คป.,ผอ.คบ.
- สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ								56%						ศสคป.ที่ 7 , ผลก.ขป.16
- เร่งซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ชำรุดให้ใช้งานได้ชั่วคราว								65%						ผอ.คป.,ผอ.คบ.
ค) แผนงานหลังอุทกภัย หรือ หลังเกิดภัย - เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ														ผอ.คป.,ผอ.คบ.
- เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารชลประทาน														ผอ.คป.,ผอ.คบ.
- ประเมินศักยภาพของปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้งรวมทั้งการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่														ผบร.ขป.16, ผอ.คป., ผอ.คบ.

* หมายเหตุ

 แผนงาน  ผลงาน

ในพื้นที่ภาคใต้จะเกิดน้ำหลากอุทกภัยในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อน สำนักชลประทานที่16 และโครงการชลประทานในความรับผิดชอบได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำระดับสำนักและระดับโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือน กรกฎาคม 2556 และได้เชิญประชุม ผชช.ชล.16, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ผสญ.๑๑, ผสก.๑๖ พก., ผสป.ที่ 7 และ ผอน.ภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากปี 2556 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556



ผส.ชล.16 ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก ปี 2556

ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ห้องประชุม สชล.16



ผส.ชล.16 ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกทกภัย ปี 2556

ณ วันที่ 27 กันยายน 2556 ห้องประชุม สชล.16



ผบร.ชล.16 ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานประจำศูนย์


ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชล.16 ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ห้องประชุม สชล.16

2. แผนและผลการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำ


สำนักชลประทานที่ 16 มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในความรับผิดชอบรวม 6 อ่าง โดยมีแผนการพร่องน้ำ โดยใช้ Reservoir Operation Study (ROS) และ Operation Rule Curve ในแต่ละอ่าง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดังนี้

1. อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จ.พัทลุง ความจุอ่าง 20.000 ล้าน ลบ.ม.
แผน พร่องน้ำเหลือ 11.540 ล้าน ลบ.ม. หรือ 58% ของความจุ
ผล ณ วันนี้ พร่องน้ำเหลือ 4.698 ล้าน ลบ.ม. หรือ 23% ของความจุ
2. อ่างเก็บน้ำคลองป่าพะยอม จ.พัทลุง ความจุอ่าง 20.500 ล้าน ลบ.ม.
แผน พร่องน้ำเหลือ 10.000 ล้าน ลบ.ม. หรือ 49% ของความจุ
ผล ณ วันนี้ พร่องน้ำเหลือ 5.133 ล้าน ลบ.ม. หรือ 25% ของความจุ
3. อ่างเก็บน้ำคลองจำไทร จ.สงขลา ความจุอ่าง 6.000 ล้าน ลบ.ม.
แผน พร่องน้ำเหลือ 3.500 ล้าน ลบ.ม. หรือ 58% ของความจุ
ผล ณ วันนี้ พร่องน้ำเหลือ 2.010 ล้าน ลบ.ม. หรือ 34% ของความจุ
4. อ่างเก็บน้ำคลองหลา จ.สงขลา ความจุอ่าง 21.420 ล้าน ลบ.ม.
แผน พร่องน้ำเหลือ 10.019 ล้าน ลบ.ม. หรือ 47% ของความจุ
ผล ณ วันนี้ พร่องน้ำเหลือ 5.180 ล้าน ลบ.ม. หรือ 24% ของความจุ
5. อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จ.สงขลา ความจุอ่าง 56.741 ล้าน ลบ.ม.
แผน พร่องน้ำเหลือ 20.028 ล้าน ลบ.ม. หรือ 35 % ของความจุ
ผล ณ วันนี้ พร่องน้ำเหลือ 29.082 ล้าน ลบ.ม. หรือ 51% ของความจุ
6. อ่างเก็บน้ำคลองท่าจีว จ.ตรัง ความจุอ่าง 18.500 ล้าน ลบ.ม.
แผน พร่องน้ำเหลือ 8.942 ล้าน ลบ.ม. หรือ 48% ของความจุ
ผล ณ วันนี้ พร่องน้ำเหลือ 13.860 ล้าน ลบ.ม. หรือ 75% ของความจุ


ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน จ.พัทลุง

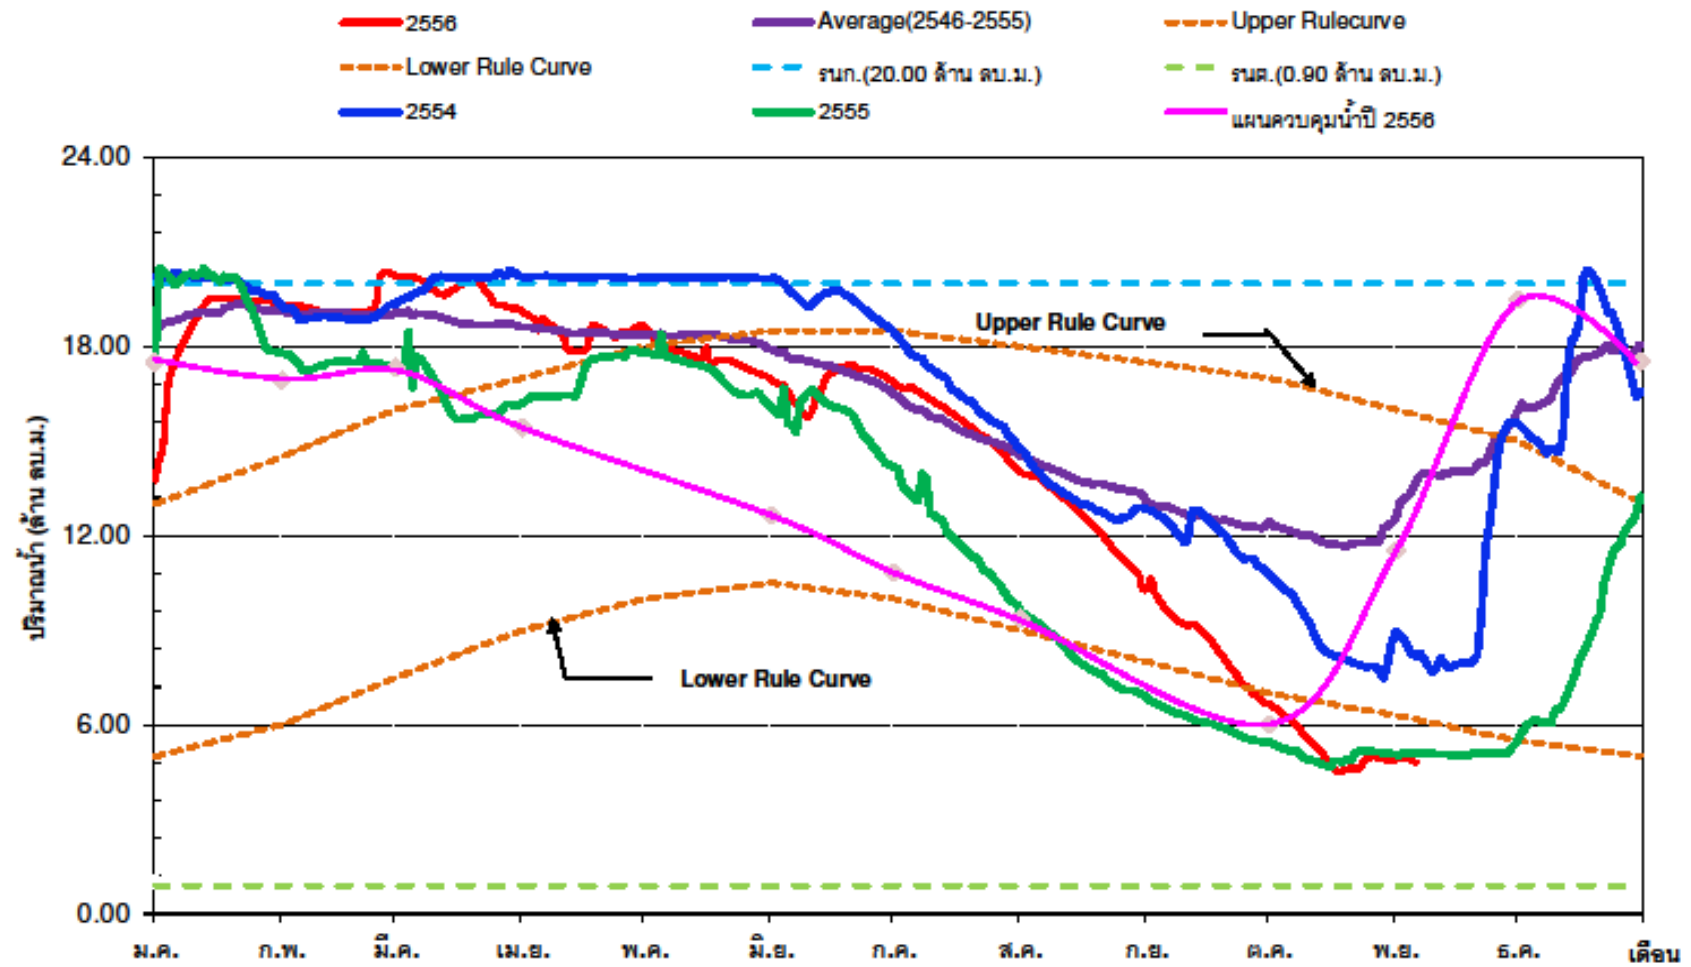


ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองป่าพะยอม จ.พัทลุง

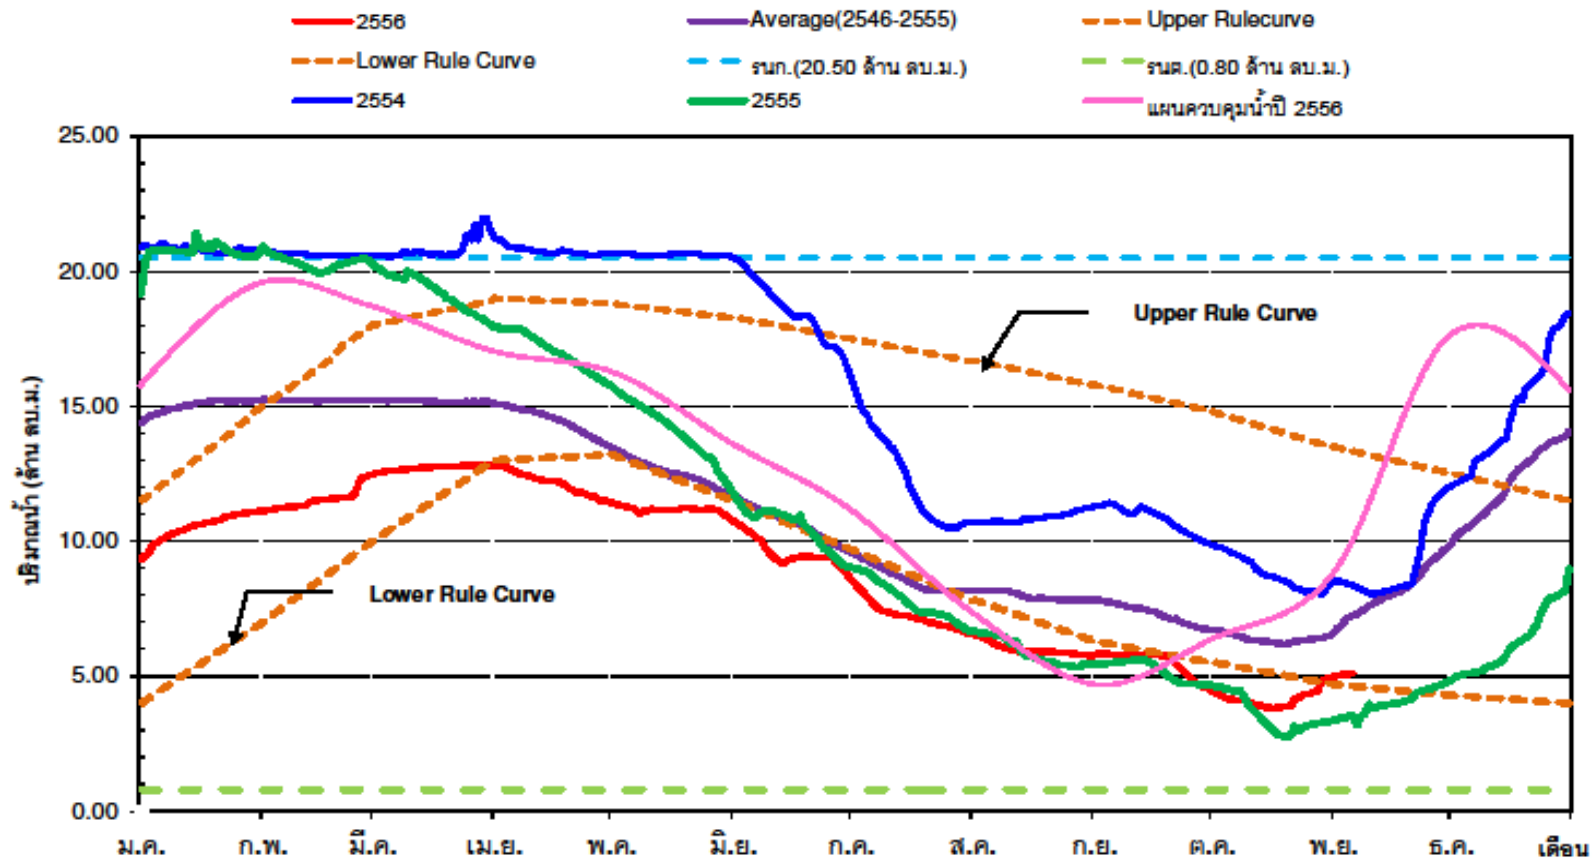


ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ คลองจำเริญ จ.สงขลา

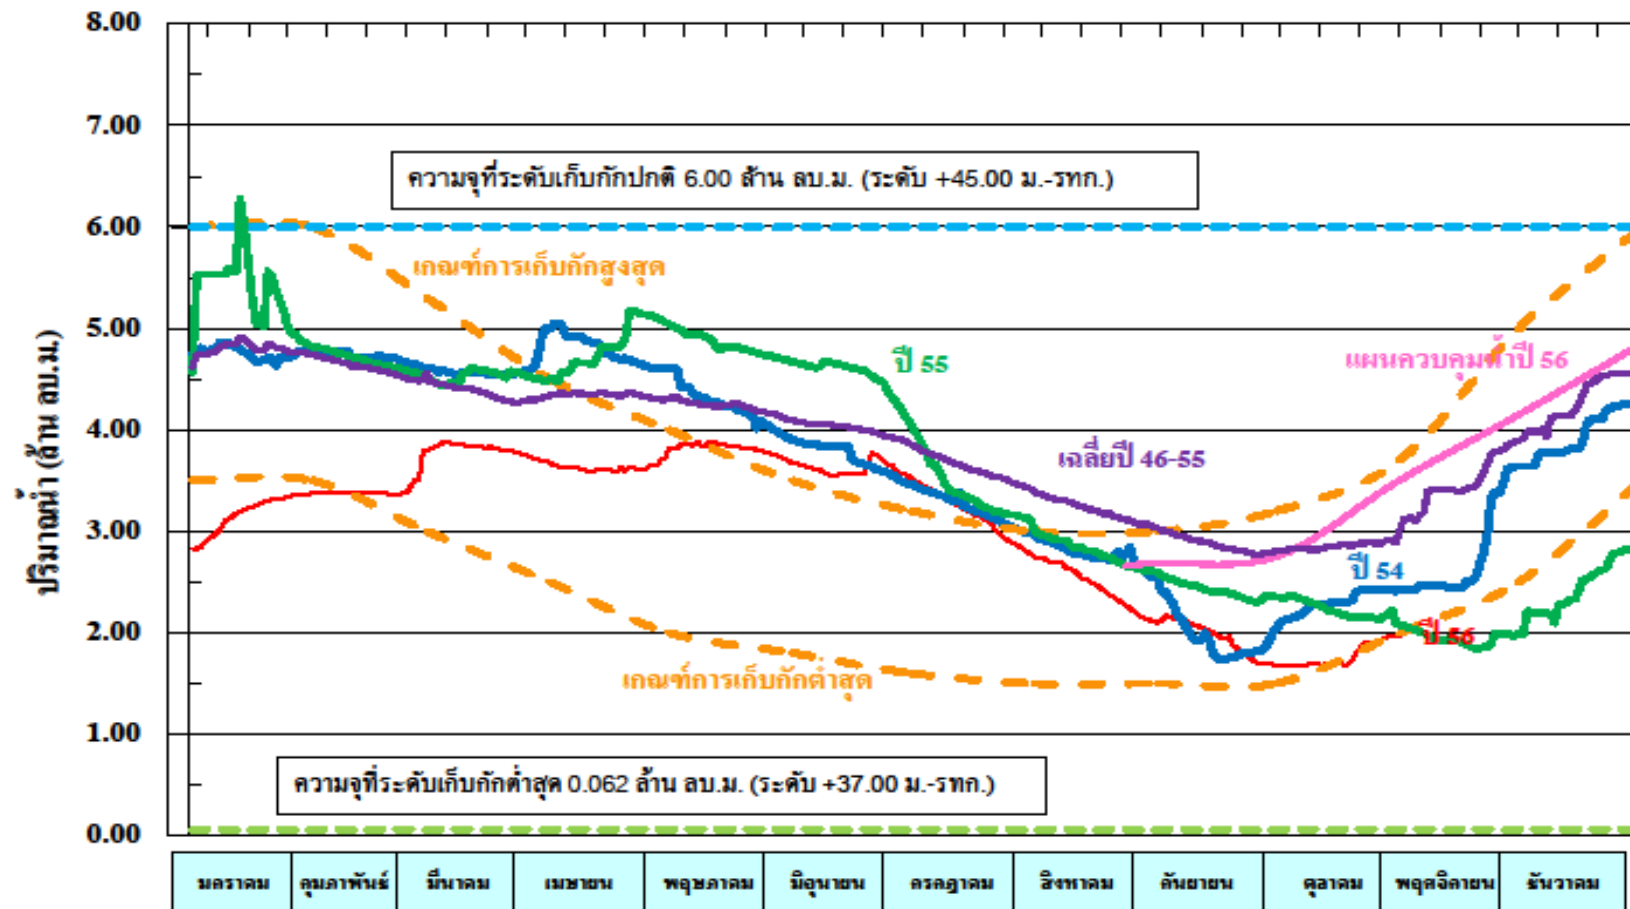

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ คลองหลา จ.สงขลา

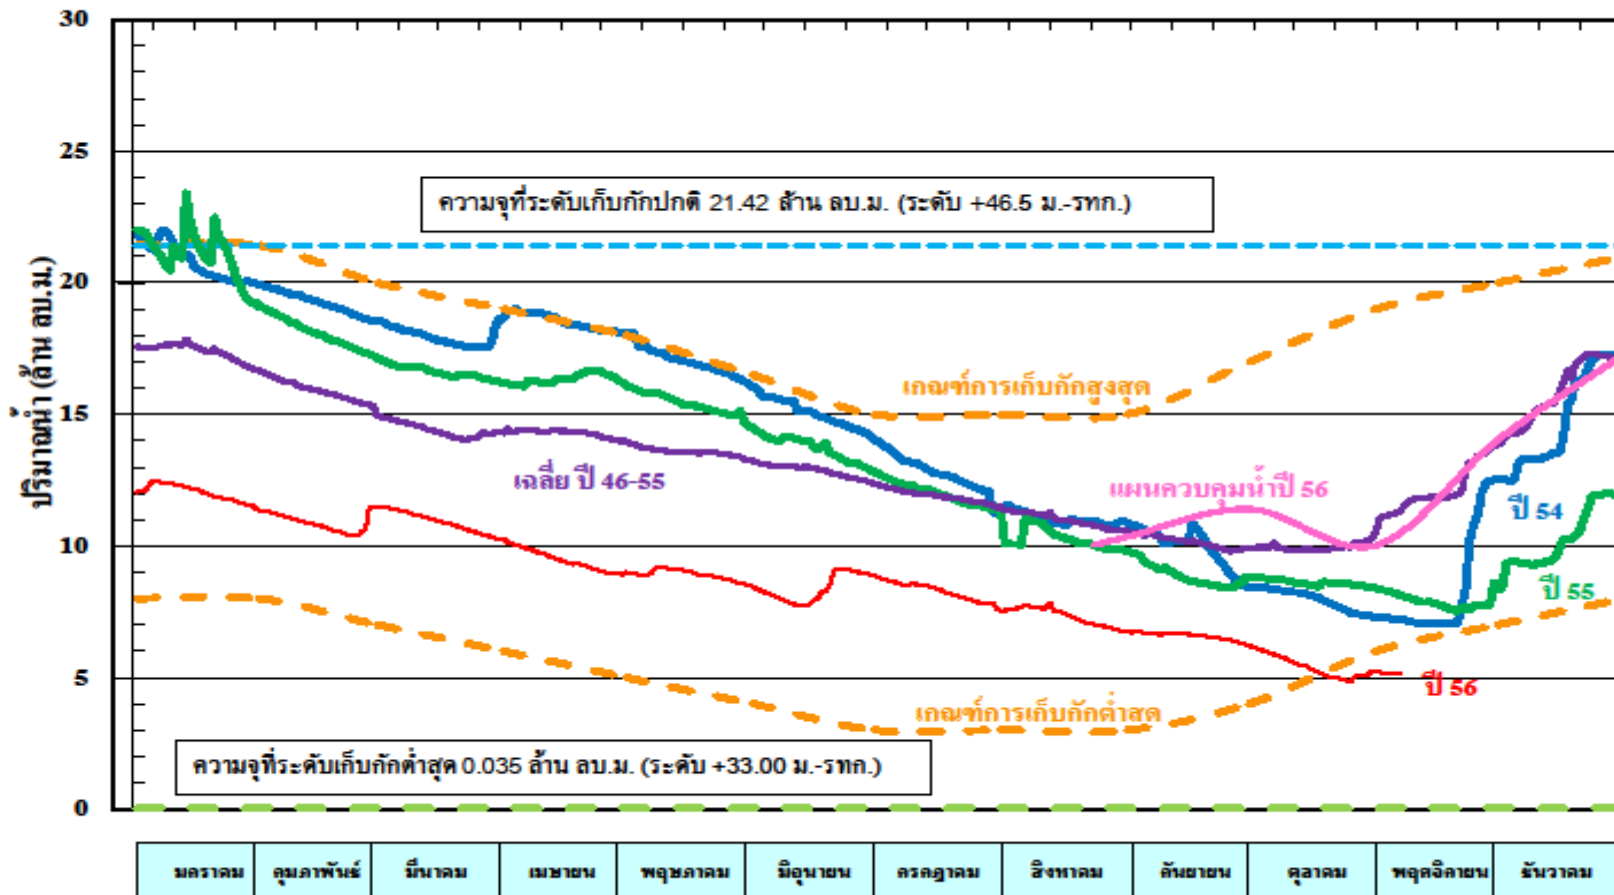


ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ คลองสะเดา จ.สงขลา

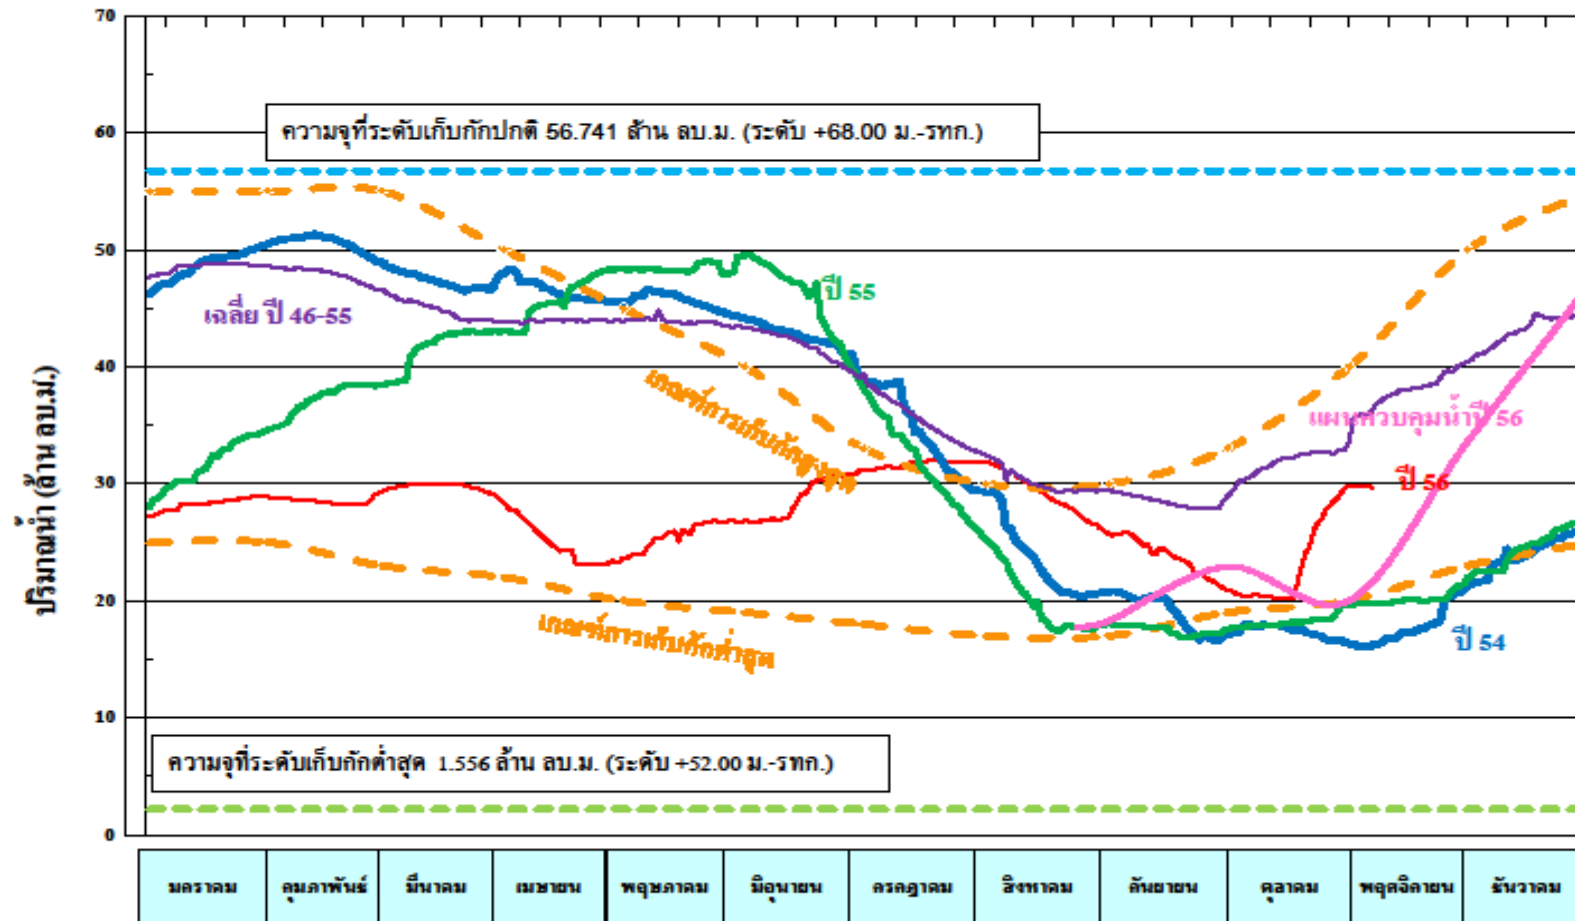

3.พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

สำนักชลประทานที่ 16 และโครงการชลประทานได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมของจังหวัดต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาบริหารจัดการน้ำหลากไว้แล้ว ดังนี้


พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จังหวัดพัทลุง

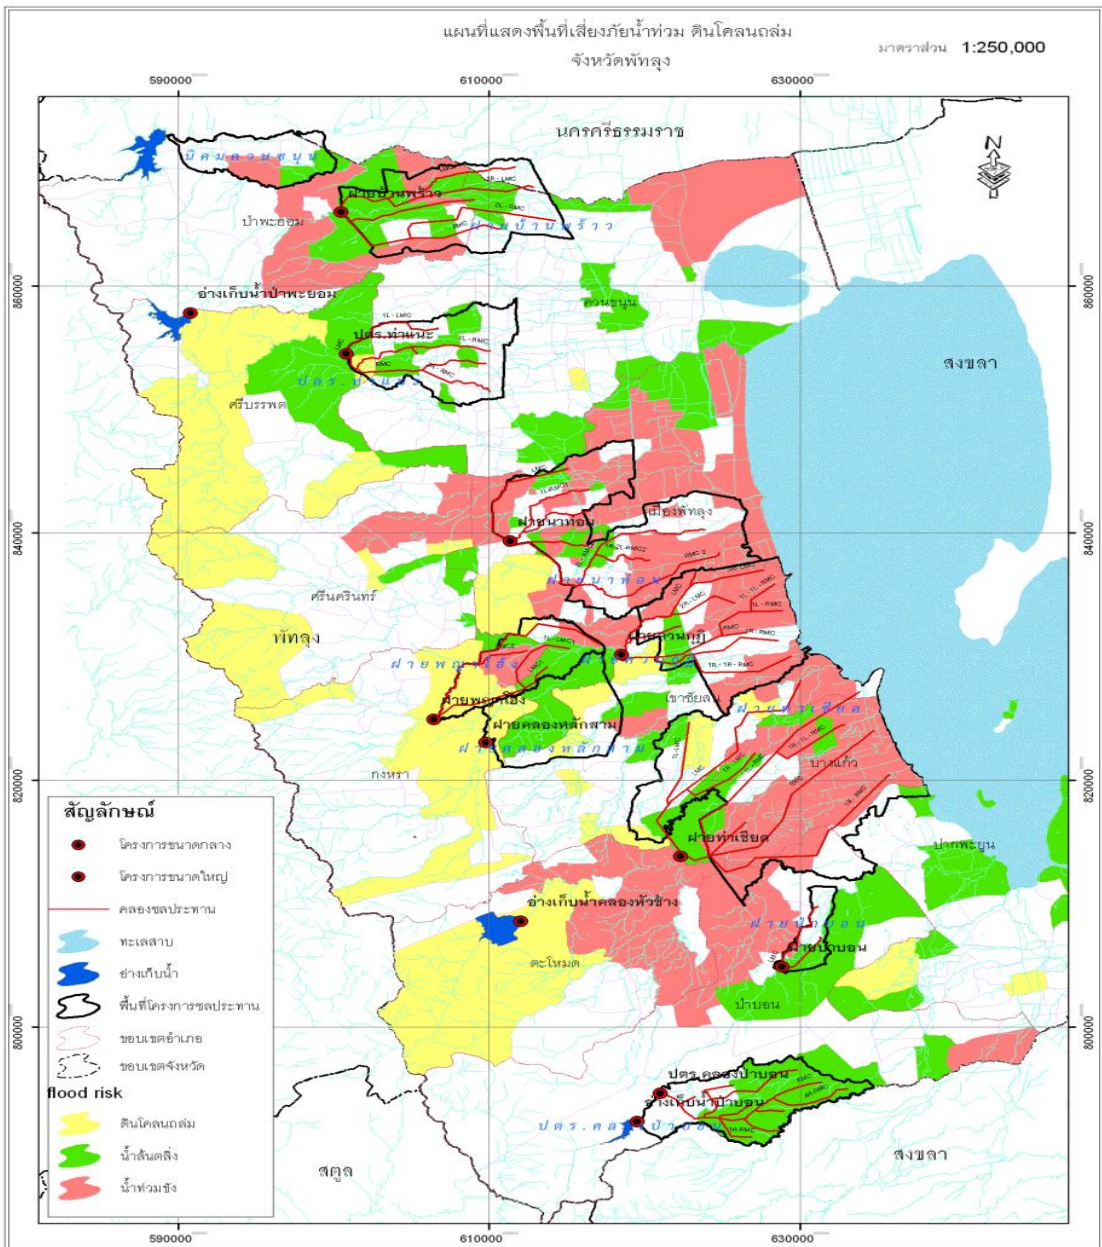

ทม.พัทลุง , ทต.แม่ขรี, ทต.เขาชัยสน, ทต.บางแก้ว และพื้นที่ริมทะเลสาบใน อ.ควนขนุน, อ.เมือง , อ.เขาชัยสน , อ.บางแก้ว , อ.ปากพะยูน

*หมายเหตุ ทม. = เทศบาลเมือง ทต. = เทศบาลตำบล

พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จังหวัดตรัง

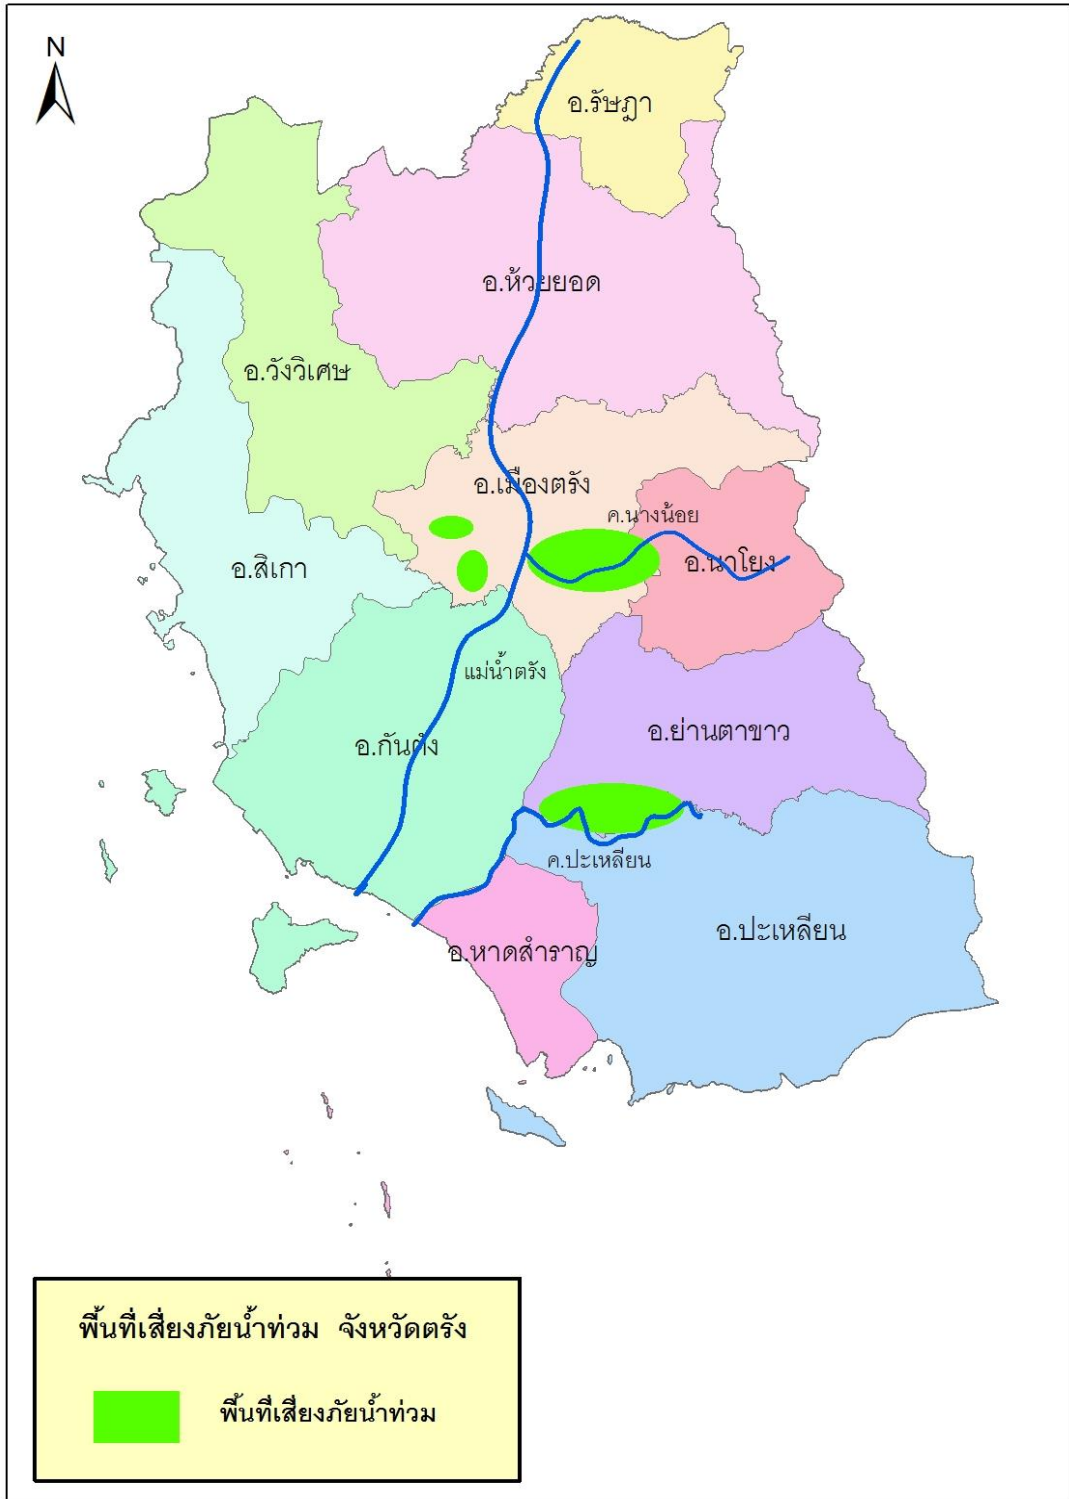

ทต.นาตาล่วง , ทต.บางรัก , ทต.บ้านโพธิ์ , ทต.นาพละ , ทต.นาโยงใต้ , ทต. ย่านตาขาว , ทต.ปะเหลียน ,
ทต.โนควน และ ทต.บางคว้น

*หมายเหตุ ทต.= เทศบาลตำบล


พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจังหวัดสตูล



ทม.เมืองสตูล, ทต.กำแพง ส่วนใหญ่อยู่ริมคลองละงู และคลองคูสน

*หมายเหตุ ทม.= เทศบาลเมือง ทต.= เทศบาลตำบล

4.การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย

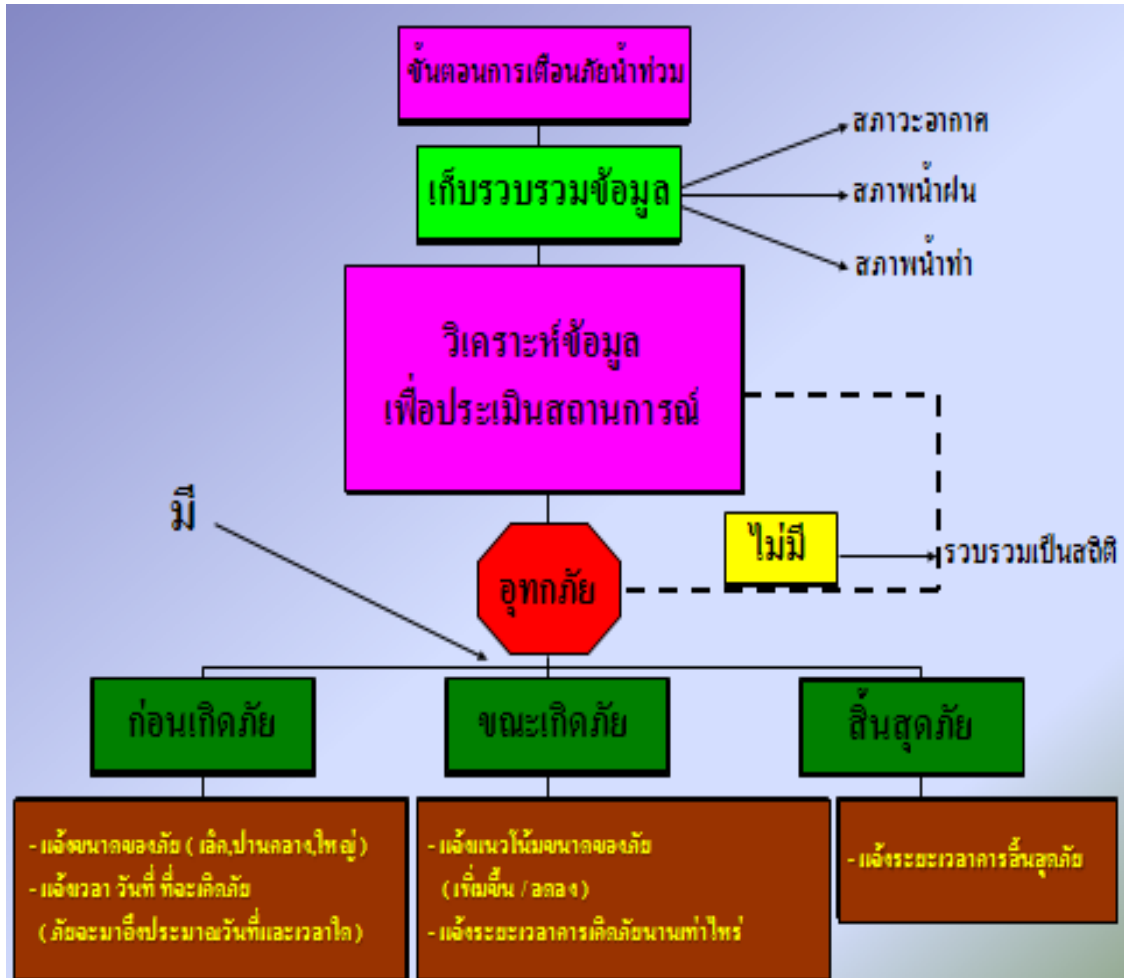

สำนักชลประทานที่ 16 ได้จัดตั้งทีมงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในกลุ่มน้ำต่างๆ พร้อมทั้ง รายงานสถานการณ์น้ำให้ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รวม 6 กลุ่มน้ำ ดังนี้

1. กลุ่มน้ำคลองนาท่อม จ.พัทลุง แจ้งเตือนภัยให้แก่ เทศบาลเมืองพัทลุง ได้ล่วงหน้า 5-7 ชั่วโมง
2. กลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จ.สงขลา แจ้งเตือนภัยให้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ล่วงหน้า 11-13 ชั่วโมง
3. กลุ่มน้ำคลองปะเหลียน จ.ตรัง แจ้งเตือนภัยให้แก่ เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้ล่วงหน้า 17-19 ชั่วโมง
4. กลุ่มน้ำตรัง จ.ตรัง แจ้งเตือนภัยให้แก่ อำเภอเมืองตรัง ได้ล่วงหน้า 10-12 ชั่วโมง
5. กลุ่มน้ำคลองคูสธ จ.สตูล แจ้งเตือนภัยให้แก่ บ้านบันจอร์ บ้านฉลุงเหนือ อ.ควนโดน ได้ล่วงหน้า 5-6 ชั่วโมง และ 23-24 ชั่วโมง
6. กลุ่มน้ำคลองละงู จ.สตูล แจ้งเตือนภัยให้แก่ เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู ได้ล่วงหน้า 11-13 ชั่วโมง

โดยมีสถานการณ์น้ำล่าสุดแต่ละกลุ่มน้ำ ดังนี้



ตารางแสดงค่าสถานีวัดน้ำฝน

	สถานี	ฝน 1 วัน	ฝน 2 วัน	ฝน 3 วัน
		7 พ.ย. 56	6-7 พ.ย. 56	5-7 พ.ย. 56
1	ฝายคลองวาด	0.0	0.0	21.5
2	อ่างเก็บน้ำคลองจำไทร-หอยโข่ง	0.0	0.0	8.5
3	อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา	0.0	0.0	0.0
4	บ้านหล้าปัง (X.113)	0.0	17.5	19.1
5	บ้านนาทองสุก	*	*	*
6	บ้านบางศาสา (X.90)	5.7	5.7	5.7
7	ร.ร.สังวาลย์วิท (อบต.เขารูปช้าง)	0.0	0.0	0.0
8	สนามบินหาดใหญ่	0.0	0.0	22.6
9	อุตุฯคอหงส์	0.0	0.0	20.0
ฝนเฉลี่ย		0.7	2.9	12.2

*ฝ้าระวังด้วยปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 120 มม./วัน

จังหวัดตรัง
ลุ่มน้ำคลองปะเหลียน
อ.ย่านตาขาว , อ.ปะเหลียน

*1

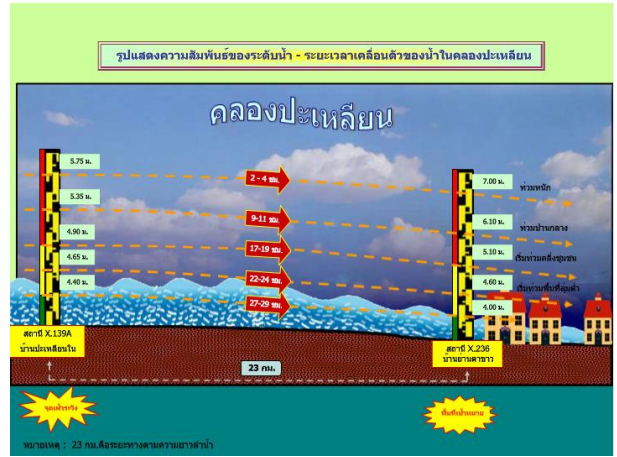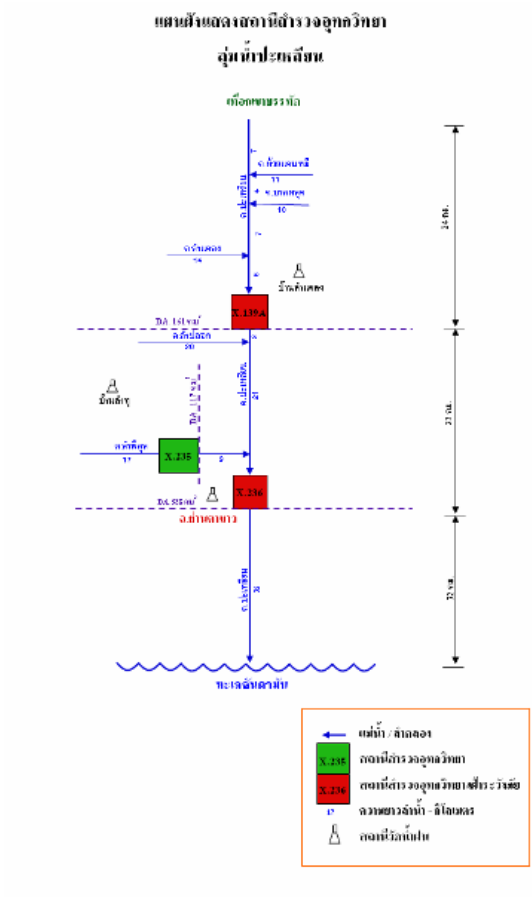

น้ำฝน

สถานี	ฝน 1 วัน	ฝน 2 วัน	ฝน 3 วัน
X.139บ้านลำแกลง	7 พ.ย. 56	6-7 พ.ย. 56	5-7 พ.ย. 56
ชล.นางน้อย	2.0	2.0	9.0
อ.ย่านตาขาว	6.0	6.0	10.3
ฝนเฉลี่ย	3.5	6.8	10.6

*ฝ้าระวังด้วยปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 100 มม./วัน

น้ำท่า

สถานีวัดน้ำท่า	วันที่/เวลา	ระดับน้ำ	ระดับฝ้าระวัง ใกล้ขีด	ระดับเตือนภัย / ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ/ตลิ่ง + สูงกว่า - ต่ำกว่า	แนวโน้ม
X.139Aบ้านลำแกลง อ.ปะเหลียน	8 พ.ย./06.00	1.47	4.90	5.10 / 4.95	-3.48	ลดลง
X.236 ทต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว	8 พ.ย./06.00	1.14	0.90	5.00 / 4.65	-3.51	เพิ่มขึ้น

แจ้งเตือนภัยให้แก่เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้ล่วงหน้า 17-19 ชั่วโมง

สถานการณ์น้ำวันนี้



ปกติ



ฝ้าระวังใกล้ขีด





เตือนภัย

จังหวัดตรัง

ลุ่มน้ำตรัง

อ.ทุ่งสง(นครศรีธรรมราช), อ.บางขัน, อ.รัษฎา, อ.ห้วยยอด, อ.วังวิเศษ, อ.นาโยง, อ.เมือง, อ.กันตัง

*1

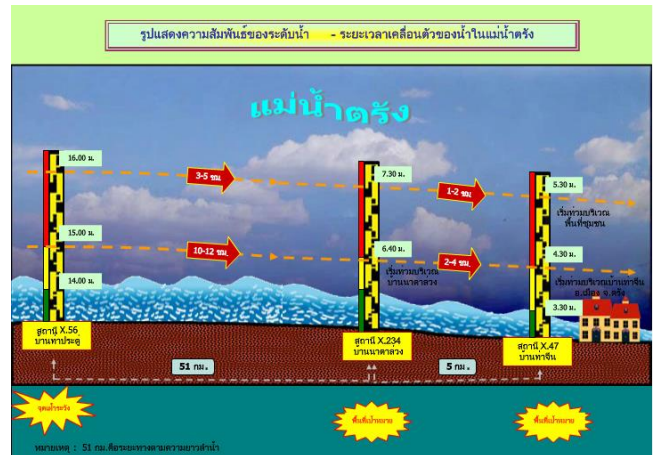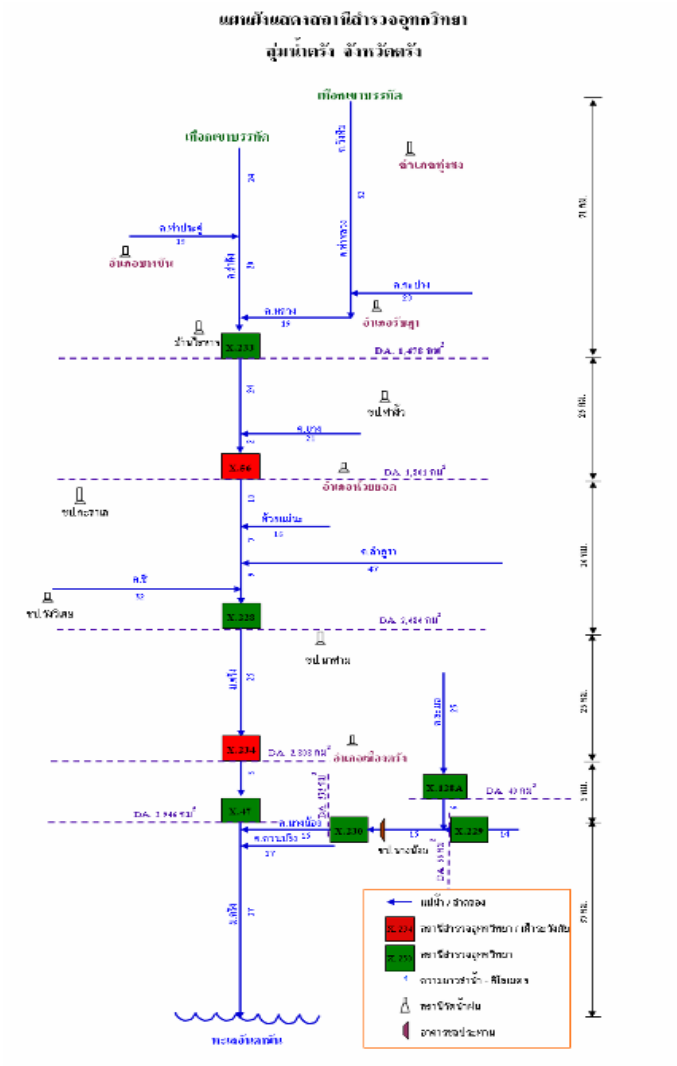

สถานี	ฝน 1 วัน	ฝน 2 วัน	ฝน 3 วัน
ชป.ตรัง	4.7	4.7	11.7
ชป.ทะเลสาบ	0.0	0.0	6.0
ชป.ท่างิ้ว	0.0	0.0	0.0
ชป.นาท่าม	11.7	11.7	11.7
ชป.นางน้อย	2.0	2.0	9.0
ฝนเฉลี่ย	3.7	3.7	6.5

*ฝ้าระวังด้วยปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 100 มม./วัน

น้ำท่า

สถานีวัดน้ำท่า	วันที่/เวลา	ระดับน้ำ	ระดับฝ้าระวัง ใกล้ขีด	ระดับเตือนภัย / ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ/ตลิ่ง + สูงกว่า - ต่ำกว่า	แนวโน้ม
X.56บ้านท่าประดู่ อ.ห้วยยอด	8 พ.ย./06.00	8.57	14.00	15.00 / 13.07	-4.50	เพิ่มขึ้น
X.234บ้านนาตาล่วง อ.เมือง	8 พ.ย./06.00	1.78	5.40	6.40 / 4.95	-3.17	เพิ่มขึ้น

แจ้งเตือนภัยให้แก่ อำเภอเมืองตรัง ได้ล่วงหน้า 10-12 ชั่วโมง

สถานการณ์น้ำวันนี้



ปกติ



ฝ้าระวังใกล้ขีด





เตือนภัย

จังหวัดสตูล

ลุ่มน้ำคูสน

อ.ควนโดน, อ.ควนกาหลง, อ.เมือง

*1

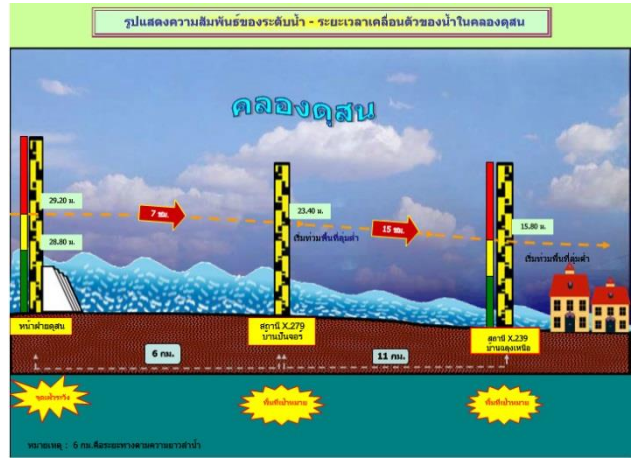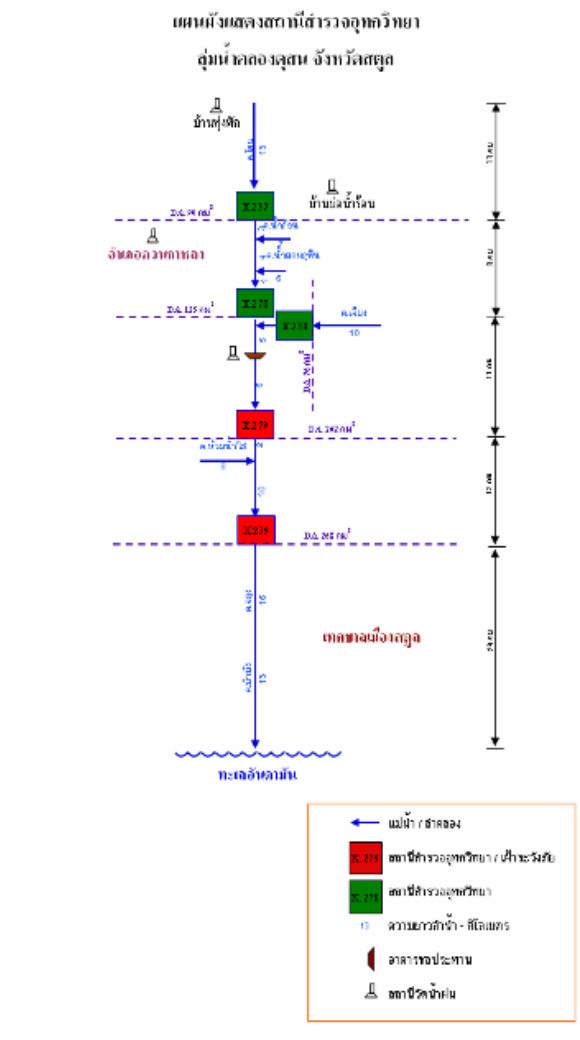

สถานี	ฝน 1 วัน	ฝน 2 วัน	ฝน 3 วัน
ฝายคูสน อ.ควนโดน	7 พ.ย. 56	6-7 พ.ย. 56	5-7 พ.ย. 56
คูสน อ.ควนโดน	0.0	0.0	18.5
คูสน อ.เมืองสตูล	0.2	5.8	5.8
บ้านป่านจอร์ อ.ควนกาหลง	*	*	*
อบต.วังประจัน อ.ควนโดน	0.0	0.0	0.0
ฝายคูสน	0.1	1.9	8.1

*ฝายระวางด้วยปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 90 มม./วัน

สถานีวัดน้ำท่า	วันที่/เวลา	ระดับน้ำ	ระดับฝายระวาง ใกล้ขีด	ระดับเตือนภัย / ระดับตลิ่ง	ระดับน้ำ/ตลิ่ง + สูงกว่า - ต่ำกว่า	แนวโน้ม
ฝายคูสน	8 พ.ย./06.00	28.42	28.80	29.20 / 33.26	-4.84	ลดลง
X.279 บ้านป่านจอร์ อ.ควนโดน	8 พ.ย./06.00	19.79	22.90	23.40 / 23.40	-3.61	เพิ่มขึ้น
X.239 บ้านลุ่มเหนือ อ.เมือง	8 พ.ย./06.00	13.81	15.60	15.80 / 16.20	-2.39	ลดลง

แจ้งเตือนภัย ให้แก่ บ้านป่านจอร์, บ้านลุ่มเหนือ อ.ควนโดน ได้ล่วงหน้า 5-6 ชั่วโมง และ 23-24 ชั่วโมง

สถานการณ์น้ำวันนี้



ปกติ



ฝายระวางใกล้ขีด



เตือนภัย

5. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทาน

โครงการชลประทานได้ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานแล้ว ตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ชป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (รอบ 12 เดือน) มีผลการตรวจสอบ ดังนี้

แบบสำรวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเขียด สำนักชลประทานที่ 16

ที่	ชื่ออาคาร	การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)	
		ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้
	-	ฝสบ.คบ.1		ฝสบ.คบ.2	
1	เขื่อนเก็บกักน้ำ	-	-	-	-
2	เขื่อนทดน้ำ	-	-	-	-
3	ฝาย	-	-	1	-
4	อาคารบังคับน้ำปากคลอง	5	-	3	-
5	อาคารบังคับน้ำกลางคลอง	-	-	-	-
6	อาคารบังคับน้ำปลายคลอง	5	-	3	-
7	อาคารควบคุมน้ำชายทะเล	-	-	-	-
8	อาคารทดน้ำ	43	-	7	-
9	อาคารน้ำตกทดน้ำ	16	-	-	-
10	รางเท	-	-	-	-
11	ท่อลอด	5	-	10	-
12	ท่อเชื่อม	-	-	-	-
13	สะพานน้ำ	51	-	-	-
14	ท่อส่งน้ำเข้านา	140	-	68	-
15	สะพาน	88	-	22	-
16	ฝายชะลอน้ำ	-	-	-	-
17	กำแพงป้องกันตลิ่ง	-	-	-	-
18	ปตร.	-	-	-	-
19	อาคารรับน้ำเข้าคลอง	-	-	-	-
20	อาคารชลประทานอื่นๆ	28	-	-	-

แบบสำรวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนิษฐ์ สำนักชลประทานที่ 16

ที่	ชื่ออาคาร	การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)	
		ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้
		ฝสบ.คบ.1		ฝสบ.คบ.2		ฝสบ.คบ.3	
1	เขื่อนเก็บกักน้ำ	-	-	-	-	-	-
2	เขื่อนทดน้ำ	-	-	-	-	-	-
3	ฝาย	-	-	1	-	-	-
4	อาคารบังคับน้ำปากคลอง	13	-	1	-	1	-
5	อาคารบังคับน้ำกลางคลอง	-	-	-	-	-	-
6	อาคารบังคับน้ำปลายคลอง	10	-	2	-	1	-
7	อาคารควบคุมน้ำชายทะเล	1	-	10	-	-	-
8	อาคารทดน้ำ	12	-	5	-	1	-
9	อาคารน้ำตกทดน้ำ	-	-	-	-	-	-
10	รางเท	-	-	-	-	-	-
11	ท่อลอด	1	-	3	-	16	-
12	ท่อเชื่อม	-	-	-	-	-	-
13	สะพานน้ำ	-	-	-	-	-	-
14	ท่อส่งน้ำเข้านา	184	-	-	-	159	-
15	สะพาน	60	-	8	-	-	-
16	ฝายชะลอน้ำ	-	-	-	-	-	-
17	กำแพงป้องกันตลิ่ง	1	-	-	-	-	-
18	ปตร.	2	-	14	-	-	-
19	อาคารรับน้ำเข้าคลอง	-	-	-	-	-	-
20	อาคารชลประทานอื่นๆ	10	-	10	-	6	-

แบบสำรวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

โครงการชลประทานพัทลุง สำนักชลประทานที่ 16

ที่	ชื่ออาคาร	การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)	
		ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้
		ฝสบ.คป.1		ฝสบ.คป.2		ฝสบ.คป.3		ฝสบ.คป.4	
1	เขื่อนเก็บกักน้ำ	-	-	1	-	-	-	1	-
2	เขื่อนทดน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ฝาย	1	-	1	-	3	-	1	-
4	อาคารบังคับน้ำปากคลอง	6	-	11	-	14	-	12	-
5	อาคารบังคับน้ำกลางคลอง	-	-	-	-	-	-	-	-
6	อาคารบังคับน้ำปลายคลอง	5	-	9	-	13	-	9	-
7	อาคารควบคุมน้ำชายทะเล	-	-	-	-	-	-	-	-
8	อาคารทดน้ำ	10	-	6	-	4	-	-	-
9	อาคารน้ำตกทดน้ำ	15	-	65	-	7	-	24	-
10	รางเท	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ท่อลอด	49	-	85	-	50	-	41	-
12	ท่อเชื่อม	-	-	24	-	2	-	-	-
13	สะพานน้ำ	-	-	-	-	-	-	1	-
14	ท่อส่งน้ำเข้านา	183	-	228	-	206	-	105	-
15	สะพาน	34	-	34	-	56	-	7	-
16	ฝายชะลอน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-
17	กำแพงป้องกันตลิ่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ปตร.	-	-	1	-	-	-	1	-
19	อาคารรับน้ำเข้าคลอง	-	-	1	-	34	-	68	-
20	อาคารชลประทานอื่นๆ	48	-	104	-	114	-	6	-

แบบสำรวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

โครงการชลประทานสงขลา สำนักชลประทานที่ 16

ที่	ชื่ออาคาร	การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)	
		ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้
		ฝสบ.คป.1		ฝสบ.คป.2		ฝสบ.คป.2 (อุตะเขาะ)		ฝสบ.คป.3		ฝสบ.คป.4		ฝสบ.คป.5	
1	เขื่อนเก็บกักน้ำ	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	เขื่อนทดน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ฝาย	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
4	อาคารบังคับน้ำปากคลอง	24	-	2	-	115	-	4	-	5	-	2	-
5	อาคารบังคับน้ำกลางคลอง	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	อาคารบังคับน้ำปลายคลอง	24	-	-	-	-	-	6	-	5	-	2	-
7	อาคารควบคุมน้ำชายทะเล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
8	อาคารทดน้ำ	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	-
9	อาคารน้ำคกทดน้ำ	73	-	1	-	-	-	24	-	11	-	1	-
10	รางเท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ท่อลอด	73	-	6	-	1	-	24	-	103	-	14	-
12	ท่อเชื่อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
13	สะพานน้ำ	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14	ท่อส่งน้ำเข้านา	184	-	13	8	-	-	133	-	123	-	33	-
15	สะพาน	11	-	69	-	-	-	13	-	68	-	3	-
16	ฝายชะลอน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	กำแพงป้องกันคลื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ปตร.	-	-	4	-	7	-	1	-	1	-	1	-
19	อาคารรับน้ำเข้าคลอง	-	-	132	18	-	-	-	-	-	-	3	-
20	อาคารชลประทานอื่นๆ	78	-	33	-	30	-	40	-	10	-	11	-

แบบสำรวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

โครงการชลประทานตรัง สำนักชลประทานที่ 16

ที่	ชื่ออาคาร	การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)	
		ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้
		ฝสบ.คป.1		ฝสบ.คป.2		ฝสบ.คป.3		ฝสบ.คป.4	
1	เขื่อนเก็บกักน้ำ	-	-	-	-	-	-	1	-
2	เขื่อนทดน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ฝาย	4	-	-	-	1	-	-	-
4	อาคารบังคับน้ำปากคลอง	6	-	16	-	4	-	-	-
5	อาคารบังคับน้ำกลางคลอง	-	-	-	-	-	-	-	-
6	อาคารบังคับน้ำปลายคลอง	6	-	16	-	4	-	-	-
7	อาคารควบคุมน้ำชายทะเล	-	-	-	-	-	-	-	-
8	อาคารทดน้ำ	11	-	64	-	-	-	-	-
9	อาคารน้ำตกทดน้ำ	15	-	-	-	11	-	-	-
10	รางเท	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ท่อลอด	73	-	32	-	28	-	13	-
12	ท่อเชื่อม	14	-	-	-	-	-	-	-
13	สะพานน้ำ	9	-	1	-	-	-	-	-
14	ท่อส่งน้ำเข้านา	101	-	142	-	57	-	-	-
15	สะพาน	41	-	17	-	10	-	-	-
16	ฝายชะลอน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-
17	กำแพงป้องกันตลิ่ง	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ปตร.	-	-	1	-	1	-	-	-
19	อาคารรับน้ำเข้าคลอง	2	-	-	-	-	-	-	-
20	อาคารชลประทานอื่นๆ	11	-	87	-	-	-	-	-

แบบสำรวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
โครงการชลประทานสตูล สำนักชลประทานที่ 16

ที่	ชื่ออาคาร	การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)		การใช้งาน (แห่ง)	
		ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้	ได้	ไม่ได้
		ฝส.บ.คป.1		ฝส.บ.คป.2		ฝส.บ.คป.3	
1	เขื่อนเก็บกักน้ำ	-	-	-	-	-	-
2	เขื่อนทดน้ำ	-	-	-	-	-	-
3	ฝาย	1	-	-	-	1	-
4	อาคารบังคับน้ำปากคลอง	3	-	-	-	7	-
5	อาคารบังคับน้ำกลางคลอง	-	-	-	-		-
6	อาคารบังคับน้ำปลายคลอง	3	-	-	-	7	-
7	อาคารควบคุมน้ำชายทะเล	-	-	2	-		-
8	อาคารทดน้ำ	4	-	-	-		-
9	อาคารน้ำตกทดน้ำ	20	-	-	-		-
10	รางเท	-	-	-	-		-
11	ท่อลอด	16	-	-	-	173	-
12	ท่อเชื่อม	6	-	-	-		-
13	สะพานน้ำ	-	-	-	-		-
14	ท่อส่งน้ำเข้านา	38	-	-	-	66	-
15	สะพาน	37	-	-	-	48	-
16	ฝายชะลอน้ำ	-	-	-	-		-
17	กำแพงป้องกันตลิ่ง	-	-	-	-		-
18	ปตร.	-	-	1	-	1	-
19	อาคารรับน้ำเข้าคลอง	-	-	-	-	16	-
20	อาคารชลประทานอื่นๆ	12	-	1	-	47	-

หมายเหตุ

ฝส.บ.คป.16 ได้สั่งการให้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ชำรุดเสียหายให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และสามารถป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยด่วนแล้ว

6. การขุดลอกคลองธรรมชาติ-คลองระบายน้ำ และงานกำจัดวัชพืช

6.1 การขุดลอกคลองธรรมชาติ-คลองระบายน้ำ

โครงการชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกคลองธรรมชาติและคลองระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลุ่มน้ำต่างๆรวมทั้งหมด 42 สาย ความยาว 89.46 กม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100 % ดังนี้

การขุดลอกคลองธรรมชาติและคลองระบายน้ำที่ดำเนินการเสร็จแล้วในปี 2556 จำนวน 42 สาย ความยาว 89.46 กม.

จังหวัด	ลุ่มน้ำย่อย	ชื่อคลองและความยาวที่ขุดลอก (ก.ม.)	พื้นที่ดำเนินการ ตำบล/อำเภอ
พัทลุง	คลองท่าเขียด	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ RMC1 กม.3+500-กม.8+000 ความยาว 4.50 กม.	ต.โคกสัก/อ.บางแก้ว
พัทลุง	คลองท่าเขียด	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ RMC2 กม.10+650-กม.12+500 ความยาว 1.85 กม.	ต.เขาชัยสน/อ.เขาชัยสน
พัทลุง	คลองท่าเขียด	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1L-RMC2 กม.0+000-กม.5+900 ความยาว 5.90 กม.	ต.เขาชัยสน/อ.เขาชัยสน
พัทลุง	คลองท่าเขียด	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1L-RMC1 กม.11+411-กม.17+100 ความยาว 5.68 กม.	ต.นาปะขอ/อ.บางแก้ว
พัทลุง	คลองป่าบอน	ขุดลอกคลองป่าบอน ความยาว 6.40 กม.	ต.ป่าบอน/อ.ป่าบอน
รวมจังหวัดพัทลุง จำนวน 5 สาย ความยาว 17.93 กม.			
สงขลา	คลองอู่ตะเภา	ขุดลอกคลองพะวง ช่วงที่ 1 ความยาว 2.10 กม.	ต.น้ำน้อย/ อ.หาดใหญ่
สงขลา	คลองอู่ตะเภา	ขุดลอกคลองแห ช่วงถนนลพบุรีราเมศวร์-คลองอู่ตะเภา ความยาว 1.50 กม.	ต.คลองแห/ อ.หาดใหญ่
สงขลา	คลองอู่ตะเภา	ขุดลอกคลองแห ช่วงวัดคลองแห-ถนนลพบุรีราเมศวร์ ความยาว 0.60 กม.	ต.คลองแห/ อ.หาดใหญ่
สงขลา	คลองอู่ตะเภา	ขุดลอกคลองอู่ตะเภา ช่วงถนนเลี่ยงเมือง-บ้านบางศาลา ความยาว 4.50 กม.	ต.ควนลัง,ต.บ้านพรุ/อ.หาดใหญ่,ต.บางศาลา/อ.คลองหอยโข่ง

จังหวัด	ลุ่มน้ำย่อย	ชื่อคลองและความยาวที่ขุดลอก (ก.ม.)	พื้นที่ดำเนินการ
			ตำบล/อำเภอ
สงขลา	คลองอู่ตะเภา	ขุดลอกคลองหะ ความยาว 2.50 กม.	ต.คอหงส์/ อ.หาดใหญ่
สงขลา	คลองอู่ตะเภา	ขุดลอกคลองโพธิ์ ความยาว 2.75 กม.	ต.น้ำน้อย/ อ.หาดใหญ่
สงขลา	คลองอู่ตะเภา	ขุดลอกคลองพานทาน ความยาว 2.10 กม.	ต.น้ำน้อย/ อ.หาดใหญ่
สงขลา	คลองอู่ตะเภา	ขุดลอกตะกอนดินคลอง ร.3 ความยาว 1.50 กม.	ต.น้ำน้อย/ อ.หาดใหญ่
สงขลา	คลองอู่ตะเภา	ขุดลอกตะกอนดินคลอง ร.6 ความยาว 1.20 กม.	ต.คอหงส์/ อ.หาดใหญ่
สงขลา	คาบสมุทรสทิงพระ	ขุดลอกคลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอก(ช่วง กม.17+570-กม.24+310) ความยาว 6.74 กม.	ต.วัดสน/ อ.ระโนด ต.ชุมพล/อ.สทิงพระ
สงขลา	คาบสมุทรสทิงพระ	ขุดลอกคลองห้วยลาด ความยาว 3.50 กม.	ต.ท่าหิน/อ.สทิงพระ
สงขลา	คลองนาทวี	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 1.66 กม.	ต.นาทวี, ต.ฉาง/ อ.นาทวี
สงขลา	คลองนาทวี	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ความยาว 1.85 กม.	ต.นาทวี, ต.ฉาง/ อ.นาทวี
สงขลา	คลองนาทวี	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำซอย 1 ขวา -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 1.45 กม.	ต.นาทวี, ต.ฉาง/ อ.นาทวี
สงขลา	คลองนาทวี	ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำซอย 2 ขวา -สายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 1.26 กม.	ต.นาทวี, ต.ฉาง/ อ.นาทวี
สงขลา	คลองนาทวี	ขุดลอกตะกอนดินคลอง 1L-LMC ปตร.คลองจะนะ ความยาว 0.50 กม.	ต.บ้านนา/ อ.จะนะ
สงขลา	คลองนาทวี	ขุดลอกตะกอนดินคลอง LMC ปตร.คลองจะนะ ความยาว 0.50 กม.	ต.บ้านนา/ อ.จะนะ
รวมจังหวัดสงขลา จำนวน 17 สาย ความยาว 36.21 กม.			

จังหวัด	ลุ่มน้ำย่อย	ชื่อคลองและความยาวที่ขุดลอก (ก.ม.)	พื้นที่ดำเนินการ ตำบล/อำเภอ
ตรัง	-	ขุดลอกคลองบกหัก ความยาว 0.20 กม.	ต.หาดสำราญ/อ.หาดสำราญ
ตรัง	-	ขุดลอกคลองบางหาด ความยาว 1.50 กม.	ต.บ้าหวี/อ.หาดสำราญ
ตรัง	แม่น้ำตรัง	ขุดลอกคลองห้วยยอด ความยาว 3.00 กม.	ต.ห้วยยอด/อ.ห้วยยอด
ตรัง	คลองปะเหลียน	ขุดลอกคลองลำชาน ความยาว 3.00 กม.	ต.ย่านตาขาว/อ.ย่านตาขาว
ตรัง	แม่น้ำตรัง	ขุดลอกคลองยางขวน ความยาว 4.60 กม.	ต.เขาขาว,ต.เขากอบ,ต.ท่าจิว/อ.ห้วยยอด
ตรัง	คลองปะเหลียน	ขุดลอกคลองลำกูรา ความยาว 3.50 กม.	ต.ลำกูรา,ต.ปากแจ่ม/อ.ห้วยยอด
รวมจังหวัดตรัง จำนวน 6 สาย ความยาว15.80 กม.			
สตูล	คลองคูสน	ขุดลอกระบบระบายน้ำห้วยถ้ำเป๊ะสายที่ 1 ความยาว 2.00 กม.	ต.ควนโดน/ อ.ควนโดน
สตูล	คลองตะงู	ขุดลอกห้วยหนองโพรง ความยาว 1.50 กม.	ต.อุไคเจริญ/ อ.ควนกาหลง
สตูล	คลองคูสน	ขุดลอกห้วยนุ้ย ความยาว 2.00 กม.	ต.ควนโดน/ อ.ควนโดน
สตูล	คลองคูสน	ขุดลอกระบบระบายน้ำห้วยถ้ำเป๊ะสายที่ 2 ความยาว 2.00 กม.	ต.ควนโดน/ อ.ควนโดน
สตูล	คลองคูสน	ขุดลอกคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.0.000-กม.0+900 ความยาว 0.90 กม.	ต.บ้านควน/ อ.เมือง
สตูล	คลองคูสน	ขุดลอกคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.4+200-กม.5+000 ความยาว 0.80 กม.	ต.ควนโพธิ์/ อ.เมือง
สตูล	คลองคูสน	ขุดลอกคลองระบาย 1 ซ้าย - คลองมาจั่ง ความยาว 0.50 กม.	ต.ควนโดน/ อ.ควนโดน
สตูล	คลองคูสน	ขุดลอกคลองระบาย 1 ข - คลองสายใหญ่ ความยาว 2.80 กม.	ต.ควนโพธิ์/ อ.เมือง

จังหวัด	ลุ่มน้ำย่อย	ชื่อคลองและความยาวที่ขุดลอก (ก.ม.)	พื้นที่ดำเนินการ
			ตำบล/อำเภอ
สตูล	คลองคูสน	ขุดลอกคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.1+100-กม.1+700 ความยาว 0.60 กม.	ต.บ้านควน/ อ.เมือง
สตูล	คลองคูสน	ขุดลอกระบบระบายน้ำห้วยถ้ำเป๊ะสายที่ 3 ความยาว 2.00 กม.	ต.ควนโดน/ อ.ควนโดน
สตูล	คลองคูสน	ขุดลอกคลองระบายน้ำสายใหญ่ กม.10+400-กม.12+092 ความยาว 1.692 กม.	ต.ควนโพธิ์/ อ.เมือง
สตูล	คลองตะงู	ขุดลอกคลองคั่นตอ ความยาว 1.78 กม.	ต.ตะงู/ อ.ตะงู
สตูล	คลองตะงู	ขุดลอกคลองระบายน้ำสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ความยาว 0.55 กม.	ต.ทุ่งนุ้ย/ อ.ควนกาหลง
สตูล	คลองตะงู	ขุดลอกคลองระบายน้ำบ้านควนสีเดิ้น ความยาว 0.40 กม.	ต.ทุ่งนุ้ย/ อ.ควนกาหลง
รวมจังหวัดสตูล จำนวน 14 สาย ความยาว 19.52 กม.			

6.2 งานกำจัดวัชพืช

โครงการชลประทานได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชในคลองธรรมชาติและคลองระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในกลุ่มน้ำต่างๆรวมทั้งหมด 15 สาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100 % ดังนี้

งานกำจัดวัชพืชที่ดำเนินการเสร็จแล้วในปี 2556 จำนวน 15 สาย

จังหวัด	ลุ่มน้ำย่อย	ชื่อคลอง	พื้นที่ดำเนินการ
			ตำบล/อำเภอ
พัทลุง	คลองนาท่อม	งานกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ(นาท่อม)	ต.โคกชะงาย , ต.ท่าแค , ท่ามิหรำ/อ.เมือง
พัทลุง	คลองสะพานหยี	งานกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย LMC (ควนกุฎิ)	ต.ควนขนุน/อ.เขาชัยสน
พัทลุง	คลองสะพานหยี	งานกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย LMC2 (พญาไธสง)	ต.สมหวัง/อ.งหรา
พัทลุง	คลองป่าบอน	งานกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปตร.คลองป่าบอน	ต.ทุ่งนารี/อ.ป่าบอน
พัทลุง	คลองป่าบอน	งานกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ (โครงการคลองป่าบอน)	ต.วังใหม่/อ.ป่าบอน
รวมจังหวัดพัทลุง จำนวน 5 สาย			
ตรัง	แม่น้ำตรัง	งานกำจัดวัชพืชบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำคลองท่าวี	ต.ท่าวี/อ.ห้วยยอด
ตรัง	คลองกะลาเสใหญ่	งานกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำกะลาเส	ต.กะลาเส/อ.สิเกา
ตรัง	คลองปะเหลียน	งานกำจัดวัชพืชหน้า ปตร.ปะเหลียน และคลองส่งน้ำ	ต.ปะเหลียน/อ.ปะเหลียน
ตรัง	แม่น้ำตรัง	งานกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าฝายนางน้อย	ต.ละมอ/อ.นาโยง
รวมจังหวัดตรัง จำนวน 4 สาย			

จังหวัด	ลุ่มน้ำย่อย	ชื่อคลอง	พื้นที่ดำเนินการ
			ตำบล/อำเภอ
สตูล	คลองคูสน	งานกำจัดวัชพืชหน้าฝายและคลองส่งน้ำ (คูสน)	ต.ควนโดน, ต.ควนสะตอ, ต.ย่านซื่อ/อ.ควนโดน ต.ฉลุง, ต.เกตรี, ต.บ้านควน, ต.คลองขุด/อ.เมือง
สตูล	คลองละงู	งานกำจัดวัชพืชหน้า ปตร.บาโรย	ต.ปากน้ำ/อ.ละงู
สตูล	คลองท่าแพร	งานกำจัดวัชพืชหน้าฝายคลองท่าแพร	ต.ควนโดน/ อ.ควนโดน
สตูล	คลองท่าแพร	งานกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายคลองท่าแพร	ต.ควนโดน/ อ.ควนโดน ต.ควนโพธิ์ , ต.ฉลุง/อ.เมือง
สตูล	คลองท่าแพร	งานกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำฝายคลองท่าแพร	ต.ควนโดน/ อ.ควนโดน ต.ควนโพธิ์ , ต.ฉลุง/อ.เมือง
สตูล	คลองคูสน	งานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหรา	ต.ควนกาหลง/อ.ควนกาหลง
รวมจังหวัดสตูล จำนวน 6 สาย			

7. แผนและผลการช่วยเหลือเครื่องจักรเครื่องมือ

สำนักชลประทานที่ 16 ได้จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำและยานพาหนะต่างๆ ดังนี้

- เครื่องสูบน้ำ	85 เครื่อง	- เรือขุด	2 ลำ	- รถบรรทุก	39 คัน
- รถขุด	12 คัน	- รถเกี่ยยดิน	3 คัน	- รถบรรทุกน้ำ	7 คัน
- รถตักหน้าขุดหลัง	3 คัน	- รถแทรกเตอร์	5 คัน	- รถเครน	1 คัน

แผนและผลการให้ความช่วยเหลือเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำและยานพาหนะต่างๆ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เครื่องสูบน้ำ (เครื่อง)		รถขุด (คัน)		รถตักหน้าขุด หลัง (คัน)		เรือขุด (ลำ)		รถเกี่ยยดิน (คัน)		รถ แทรกเตอร์ (คัน)		รถบรรทุก (คัน)		รถบรรทุก น้ำ (คัน)		รถเครน (คัน)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 7	68		6		-		2		1		3		6		-		-	
	-พัสดุ	(18)	2																
	-สงขลา	(50)	31																
	-ตรัง																		
	-สตูล																		
2	ส่วนเครื่องจักรกล สขป.16	-		6		3		-		2		2		10		3		-	
3	โครงการก่อสร้าง สขป.16	2		-		-		-		-		-		10		3		-	
4	โครงการส่งน้ำฯระโนด-กระแสดินธุ์	14		-		-		-		-		-		-		-		-	
5	สำนักงานก่อสร้าง 11 สพญ.	-		-		-		-		-		-		2		1		1	
6	สำนักงานก่อสร้าง 16 สพก.	1		-		-		-		-		-		11		-		-	
	รวม	85	33	12		3		2		3		5		39		7		1	



8. สรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก ปี 2556 เฉพาะลุ่มน้ำคลองอุตะเถา อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา

บริเวณตอนต้นลุ่มน้ำ

ดำเนินการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา ความจุ 56.741 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำคลองหลา ความจุ 20.420 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำคลองจำไทร ความจุ 6.000 ล้าน ลบ.ม.

แผน จะพร่องน้ำ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 อยู่ที่ประมาณ 35%, 47%, 58% ของความจุอ่างตามลำดับ

ผล พร่องน้ำ ณ วันที่อยู่ที่ 51%, 24%, 34% ของความจุอ่างตามลำดับ

บริเวณตอนกลางลุ่มน้ำ

ได้เตรียมความพร้อมของประตูระบายน้ำคลองอุตะเถาและประตูระบายน้ำคลอง ร.1 ในการจัดการจราจรทางน้ำโดยผันน้ำอ้อมเมืองหาดใหญ่ไปตามคลอง ร.1 **แผน** ระบายน้ำในคลองอุตะเถาให้รักษาระดับน้ำอยู่ต่ำสุดที่ระดับ +2.50 ม. (รทก.) ไม่ให้เกิดผลกระทบกับการสูบน้ำเพื่อทำการประปา **ผล** ระดับน้ำ ณ วันที่อยู่ที่ระดับ + 2.63 ม.

บริเวณตอนปลายลุ่มน้ำ

ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 9 สาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงทะเลสาบสงขลาให้เร็วที่สุด **ผลงาน** ขณะนี้ได้ขุดลอกเสร็จแล้ว 100%

เตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักร – เครื่องมือ

แผน ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 – 12 นิ้ว จำนวน 57 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ (Hydro flow) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น รถขุด รถบรรทุกฯ จำนวน 22 คัน

ผล ณ วันนี้ได้ช่วยเหลือเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 21 เครื่อง ในเขตตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ 6 เครื่อง , ในเขตตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ 10 เครื่อง และในเขตตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ 5 เครื่อง
